


快適で安全な道づくり事業 一般国道293号 鹿沼市仁神堂工区 事業概要

事業区分	事業名	事業延長 ・計画諸元	全体事業費 (億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
道路	1 快適で安全な道づくり事業 一般国道293号 仁神堂工区 鹿沼市仁神堂町	L=800m W=16.0m	(15.0) 22.0	R2～ (R8) R13	44% [64%]	交安事業 のため 対象外	- 全体事業費の見直し 理由: 労務資材単価の高騰による工事費及び補償費の増 - 計画事業期間の延伸 理由: 用地取得に不測の時間を要しているため	本事業箇所は、用地を64%取得済であり、一部工事にも着手していることから、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継続

位置図

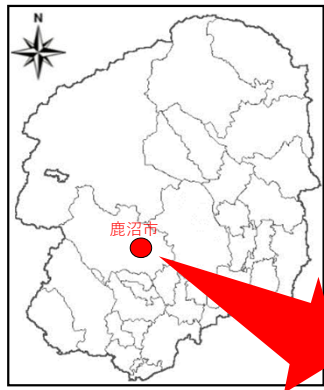

整備内容

歩道整備(現道拡幅)



事業の整備効果等

- ・歩道及び自転車通行空間の整備により、歩行者や自転車の安全な通行空間の確保
- ・仁神堂橋付近の道路縦断の嵩上げによる冠水対策により、災害時の救援活動や物資輸送に資する緊急輸送道路としての機能強化

＜現況①＞



＜整備状況②＞



凡例

事業箇所	■ ■ ■
事業済箇所	■
近隣事業	■
