


快適で安全な道づくり事業 一般県道佐野太田線 足利市福居町工区 事業概要

事業区分	事業名	事業延長 ・計画諸元	全体事業費 (億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
道路	1 快適で安全な道づくり事業 一般県道佐野太田線 福居町工区 足利市福居町	L=1,000m W=14.0m	(15.0) 22.0	R2～ (R8) R13	46% [58%]	交安事業 のため 対象外	・全体事業費の見直し 理由: 労務資材単価の高騰による工事費及び補償費の増 ・計画事業期間の延伸 理由: 用地取得に不測の時間を要しているため	本事業箇所は、用地を58%取得済みであることから、引き続き現計画で事業を継続することが <u>妥当</u> と考える。	継続

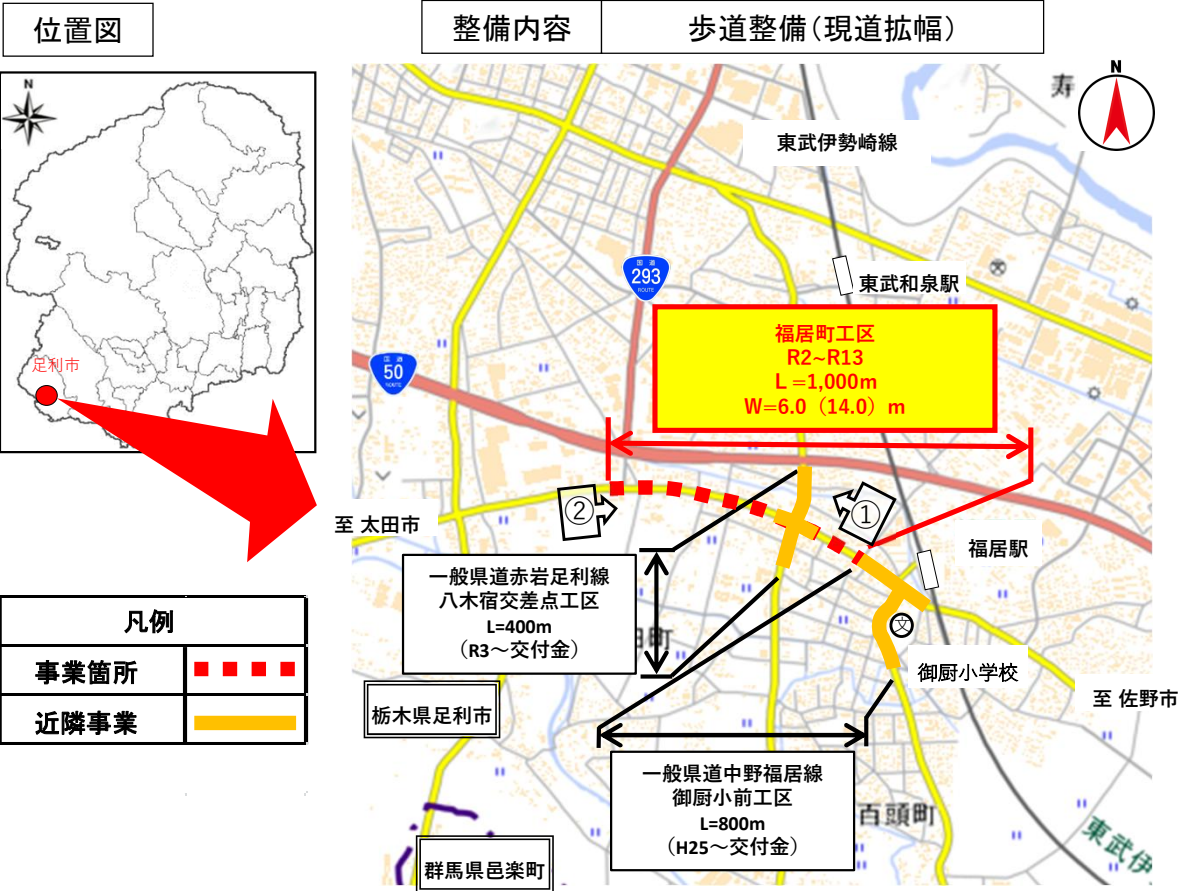

事業の整備効果等

- ・歩道の整備により、歩行者の安全な通行空間の確保
- ・右折車線整備等の交差点改良により、円滑な交通を確保

<整備前①>



<整備前②>

