


安全な川づくり事業 一級河川 武名瀬川 事業概要

事業区分	事業名	事業延長・計画諸元	全体事業費(億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
河川	安全な川づくり事業 一級河川 武名瀬川 上三川町 上三川	L=6,500m W=13m	(70.0) 90.0	H9 (R8) ~R18	86% [71%]	5.5	労務費資材費の高騰分として事業費を増額し、用地買収の遅れから計画事業期間を延伸するものの、事業計画に大きな変更はない。	本事業箇所は、流下能力不足のため出水時には沿川で浸水被害が発生しており、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継 続

位置図




整備内容 掘削、築堤、護岸等

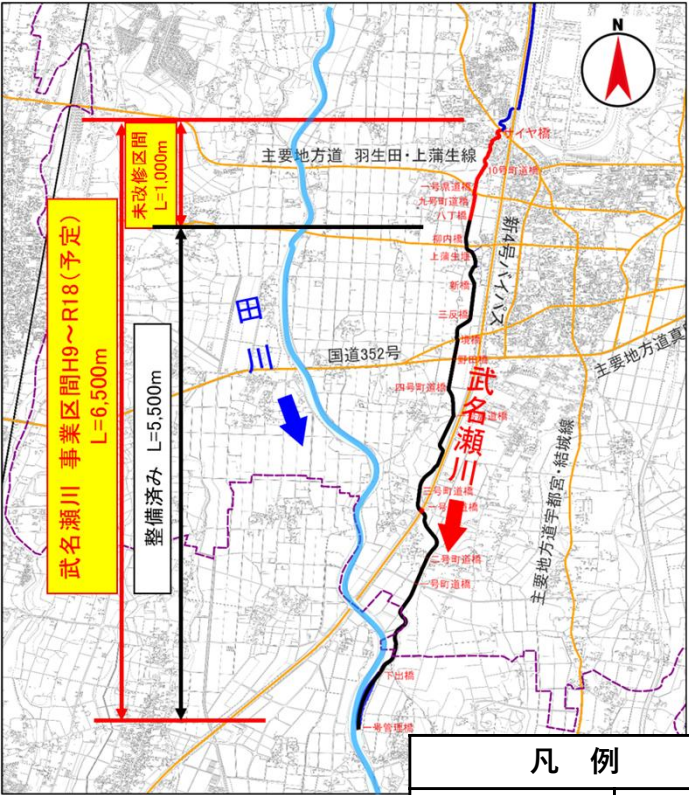

凡 例	
事業箇所	—
整備済箇所	—

標準横断面図



事業の整備効果等

- ・河道断面の拡大、橋梁の架け替え等により
浸水被害を軽減

<出水状況>



<整備状況>

