


安全な川づくり事業 一級河川 菊沢川 事業概要

事業区分	事業名	事業延長・計画諸元	全体事業費(億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体 B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針 (原案)
河川	安全な川づくり事業 一級河川 菊沢川 佐野市 堀米町	L=4,400m W=26m	(28.0) 30.7	H24 (R13) ~R18	25% [29%]	17.3	労務費資材費の高騰分として事業費を増額し、用地買収の遅れから計画事業期間を延伸するものの、事業計画に大きな変更はない。	本事業箇所は、流下能力不足のため出水時には沿川で浸水被害が発生しており、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継 続

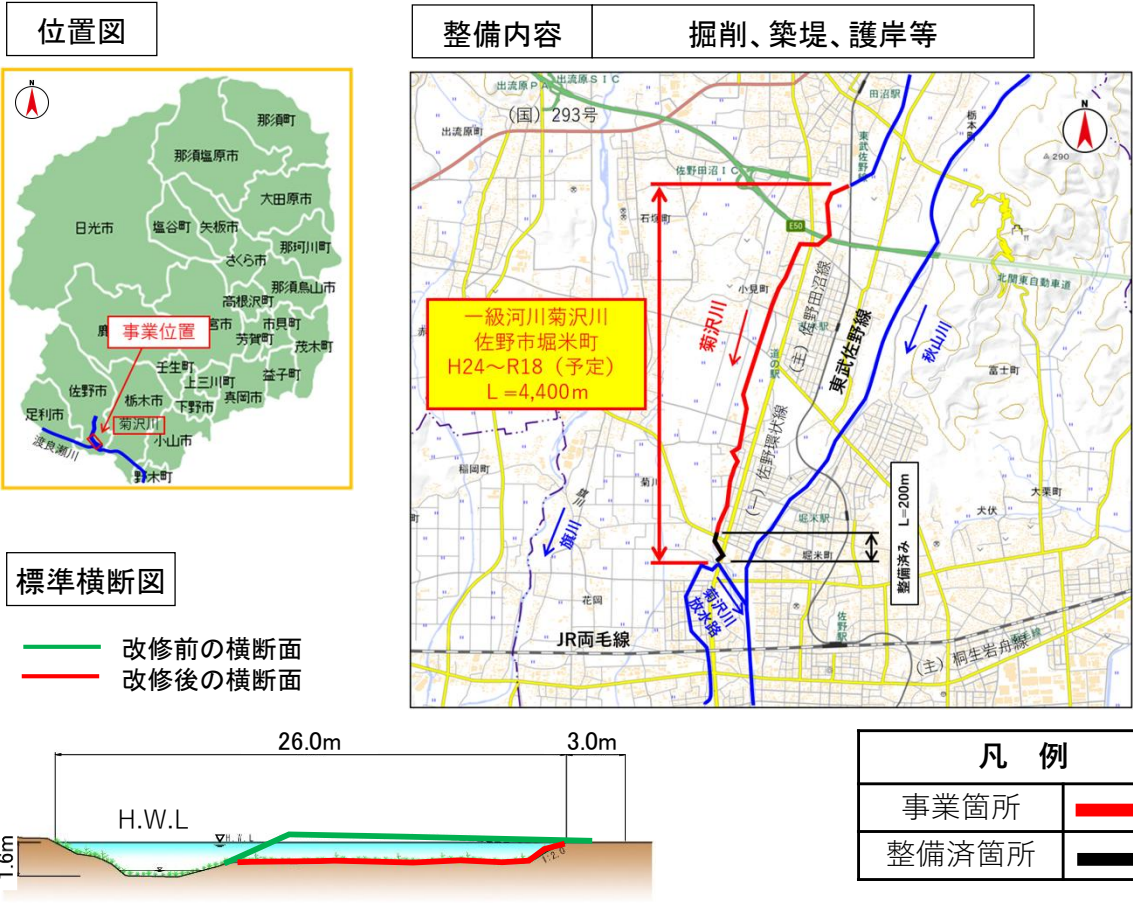

事業の整備効果等

- ・河道断面の拡大、橋梁の架け替え等により
浸水被害を軽減

<出水状況>



平成27年関東・東北豪雨

菊沢橋下流

<整備状況>



整備後(大芝橋上流)
