


安全な川づくり事業 一級河川 大芦川 事業概要

事業区分	事業名		事業延長・計画諸元	全体事業費(億円)	事業期間	事業進捗 [用地補償] (事業費ベース)	事業全体B/C	事業の主な変更点及び理由	再評価の視点	対応方針(原案)
河川	安全な川づくり事業 一級河川 大芦川 鹿沼市 北半田		L=13,200m W=110m	(70.0) 75.0	H19 (R5) ~R13	89% [100%]	5.4	労務費資材費の高騰分として事業費を増額し、下流思川の河川改修との整合を図り流域全体における治水効果を確実に発現させるため、計画事業期間を延伸するものの、事業計画に大きな変更はない。	本事業箇所は、流下能力不足のため出水時には沿川で浸水被害が発生しており、引き続き現計画で事業を継続することが妥当と考える。	継 続


位置図



整備内容 掘削、護岸等

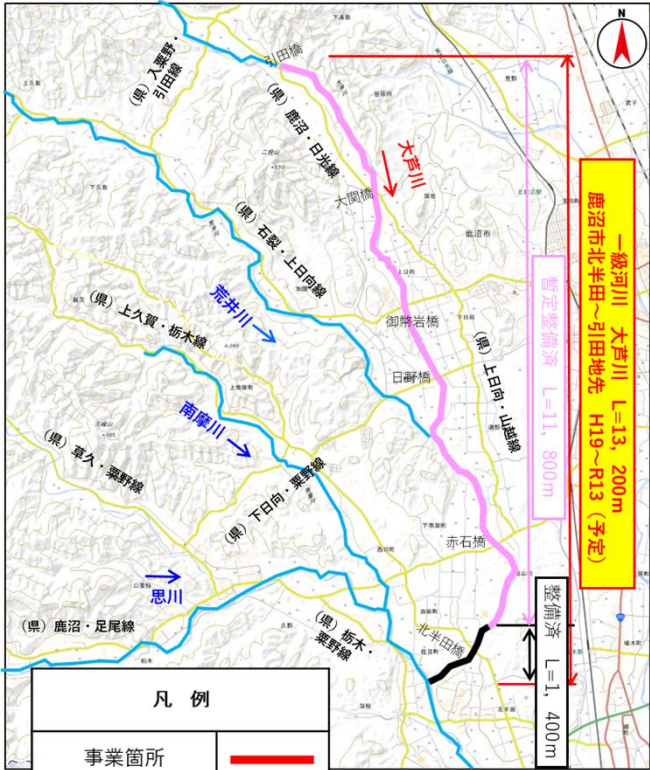

標準横断面図



凡 例	
事業箇所	—
整備済箇所	—
暫定整備済	—

事業の整備効果等

- ・河道断面の拡大により浸水被害を軽減

<出水状況>



<整備状況>

