

巴波川地下捷水路（地下トンネル河川）工事のお知らせ

令和7年8月

奥村・岩田地崎特定建設工事共同企業体
栃木県 栃木土木事務所

◆はじめに

皆様におかれましては、日ごろから「巴波川地下捷水路（しょうすいろ）整備事業」に深いご理解と多大なご協力をいただき感謝申し上げます。


巴波川地下捷水路本体建設工事に関しまして、工事進捗状況、シールド機の現在位置、地表面測定結果、今後の掘進予定等について、以下のとおりお知らせいたします。

◆工事進捗状況（R7年7月下旬現在 シールドトンネル施工済み延長 112.2m／計画延長 2,409.5m）

令和7年4月にシールド機によるトンネルの掘削を開始し、途中で3回の設備増設工事を行い、巴波川の直下、深さ約9m、平成橋、新橋の下を掘り進んで約100m掘進しました。

現在は、工事用エレベータの設置など設備増設工事をおこなっており、8月から本格的な掘進作業を再開します。

◆シールド機の現在位置

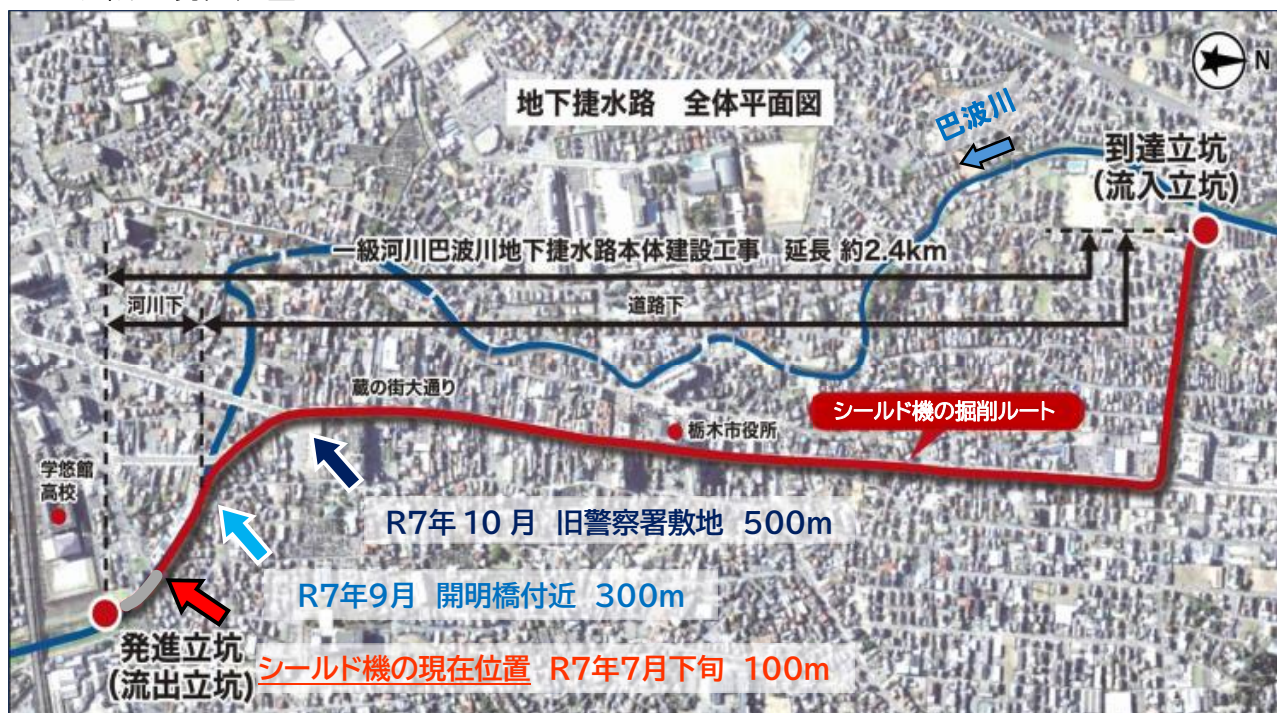


◆地表面測定結果

シールド機によるトンネル掘削の影響を調べるために、20m間隔で測定ポイントを設け、地表面の高さを測定しています。

測定は、シールド機が通過する1週間前から測定し、通過中は毎日、通過後も一定期間(概ね6ヶ月間)測定します。

現在までのところ、変位量は異常ありません。

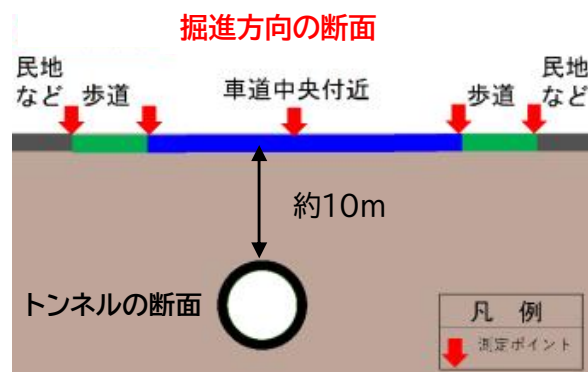

地表面測定

裏面につづく

◆今後の掘進予定

年月	令和7年（2025年）					令和8年（2026年）						
工事の内容	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
トンネル掘削工 (シールド機による掘進)												
概略位置 及び トンネル掘進距離(累計)		▼開明橋付近 (300m)			▼栃木市役所付近 (1,100m)			▼足利銀行新栃木支店 (1,960m)				

※工事の状況により変更することがありますのでご了承ください

◆その他

トンネルを掘る機械「シールド機」および完成部分のトンネルを写真にてご紹介します。

①令和6年9月 シールド機工場検査
(直径 6.16m×長さ 7.9m)

②令和7年7月 トンネル坑内



◆おわりに

今後も、安全・安心を最優先に、工事を進めてまいりますので、お気づきの点がございましたら、以下のお問い合わせ先までご連絡ください。

引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

なお、本回覧は、シールド機が今後1ヶ月間に通過すると想定される自治会に配布しています。

◆お問い合わせ先

奥村・岩田地崎特定建設工事共同企業体
〒328-0053 栃木市片柳町1-22-7
メゾン・シェーナ 102号室
TEL：080-7712-0874

栃木県栃木土木事務所改良復旧部
〒328-8504 栃木市神田町6-6
TEL：0282-23-3921



工事の進捗状況につきましては、巴波川地下捷水路（しょうすいろ）整備事業のホームページにも掲示しております。こちらのQRコードから、または、インターネット検索「街なか守る巴波川」でご覧いただけます。

本回覧を栃木土木事務所ホームページに毎月掲載いたします。また、本回覧とは別に、巴波川地下捷水路関係自治会全体に3ヶ月に1回、回覧を配布いたします。
