


1月の工事状況

～市貝町椎谷地区～

第1工区：暗渠排水工事

吸水管と疎水材を布設し、約1ヶ月の乾燥期間を経てから、表土の埋め戻しを行いました。

乾燥させることでヒビが入り、吸水渠への通水性が向上します。

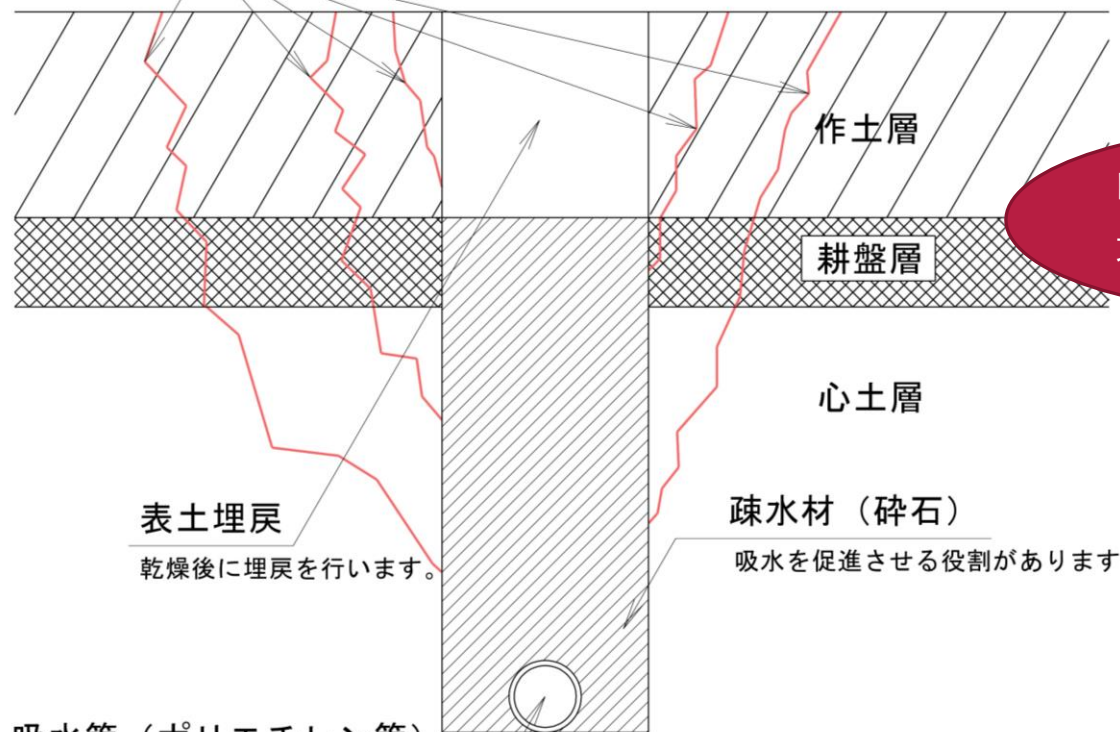

吸水管 (ポリエチレン管)

余分な地下水を吸収し、圃場外へ流します

吸水管と疎水材が埋設されています

表土の埋め戻しが完了した圃場



1月の工事状況

～市貝町椎谷地区～



鉄筋が骨
なっています



椎谷上溜

第2工区：ため池改修工事
現在、南側の堤防について、東半分の
改修が始まりました。
また、鉄筋にコンクリートが打設され、
洪水吐が形になってきました。
